

Schengen – skúsenosti s projektovým riadením

Ing. Vladimír Dudlák, PMP
Hewlett-Packard Slovakia

eFOCUS




Schengen



Schengen – Fakty

- 14. júna 1985
- 27 členov
- 420 + mil. obyvateľov
- 4.3 + mil. km²

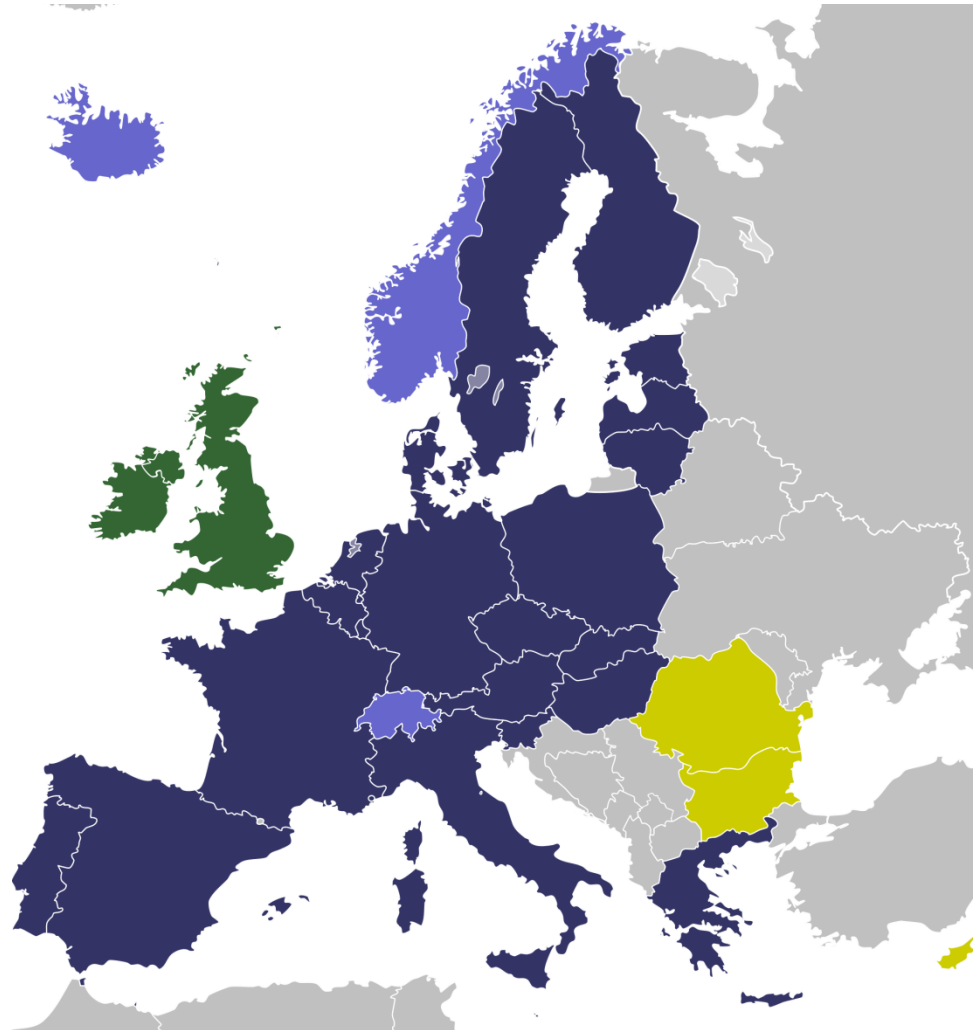


Schengen - Základné info o projekte

- **Názov projektu:** Národné komunikačné rozhranie pre Schengenský informačný systém II (NG SIS II)
- **Zákazník:** Ministerstvo vnútra SR 
- **Dodávateľ:** Hewlett-Packard Slovakia 
- **Partneri:** Gratex International
Anasoft APR 

- **Zahájenie projektu:** Máj 2006
- **Základný rozsah (SoW):** Analýza, Návrh, Aplikačný vývoj, Testovanie, Školenia, Dokumentácia, Podpora pri nasadení do prevádzky

Schengen - Rozdelenie zodpovednosti

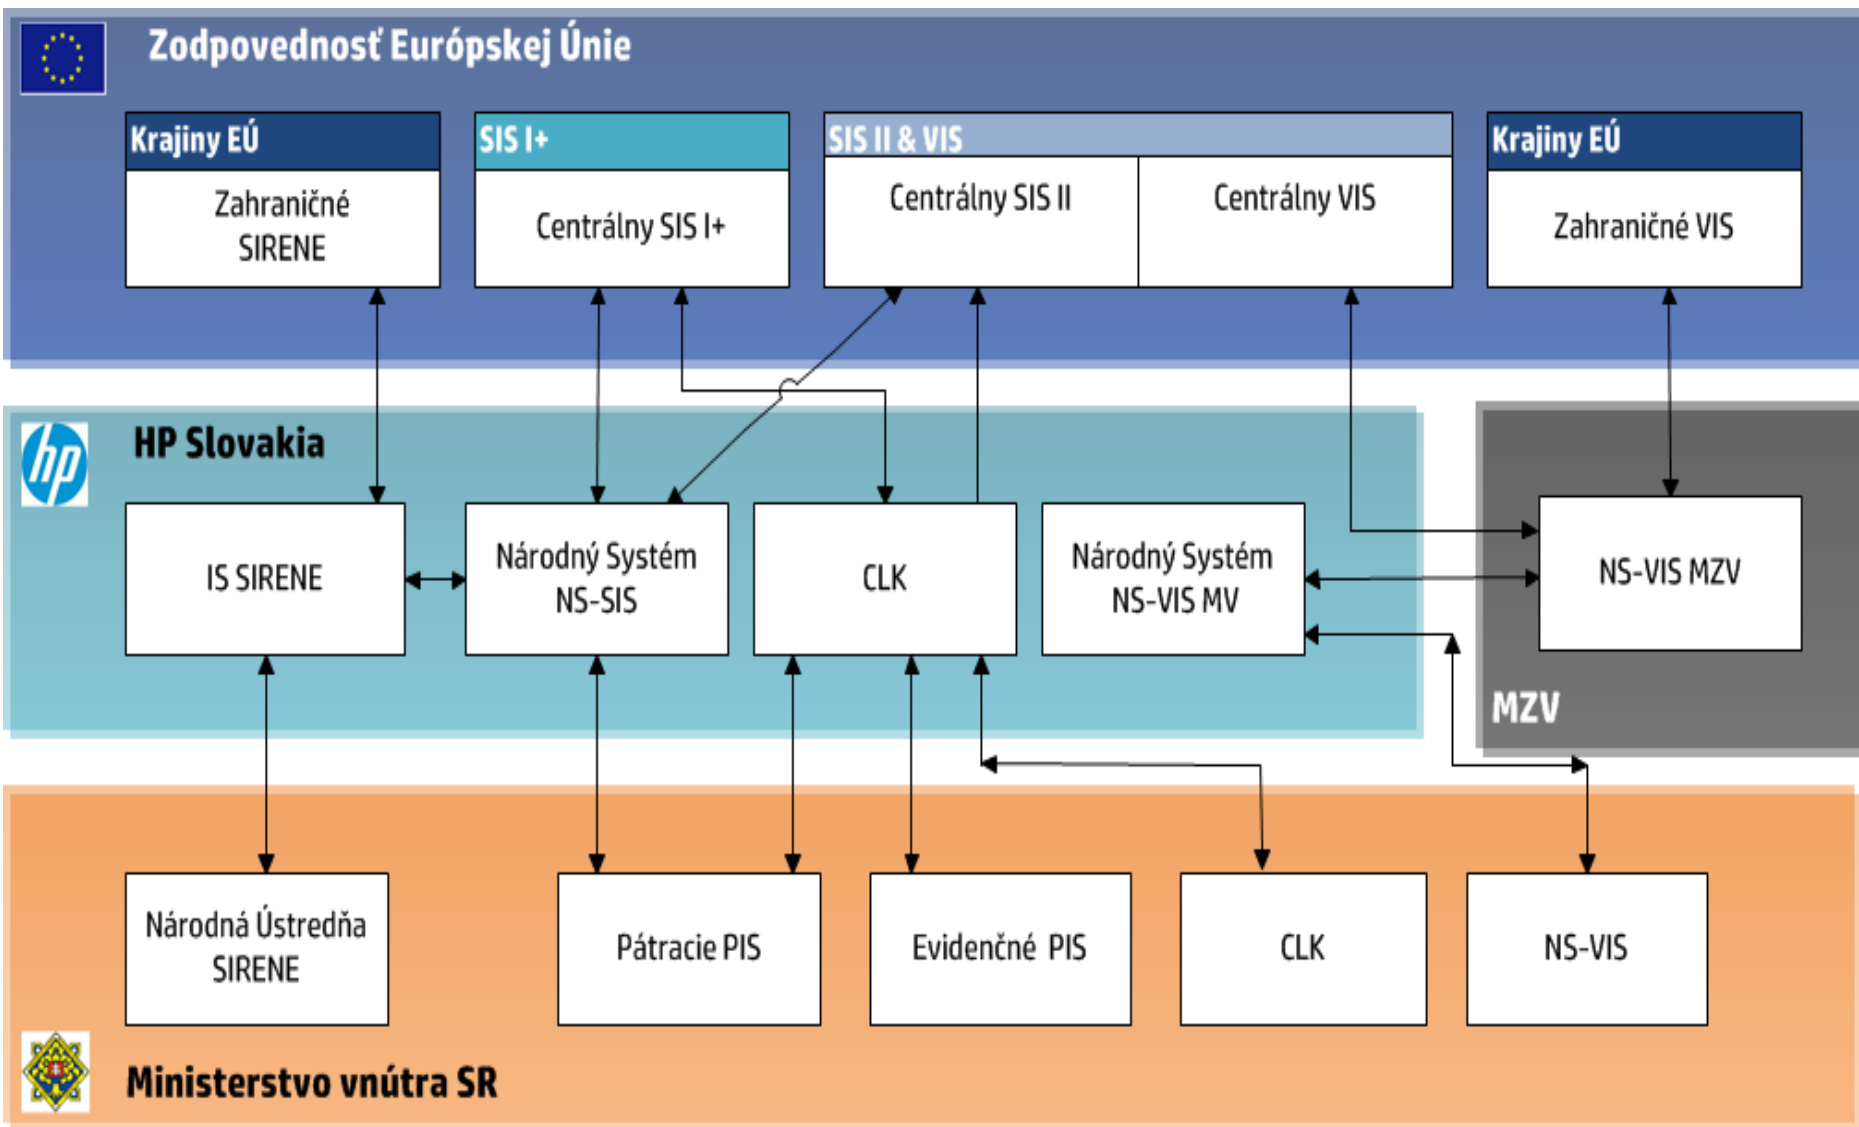

Schengen – Projektové úspechy

- Slovensko prešlo úspešne evaluáciou EK a bolo integrované do **schengenského priestoru** spolu s ďalšími ôsmymi štátmi **21.12.2007**.
- V roku 2008 bol projekt Schengen nominovaný v rámci IT GALA na IT projekt roka a dostal sa medzi 5 najúspešnejších IT projektov na Slovensku.
- V roku 2008 získal projekt Schengen špeciálne ocenenie ITAPA.

Projektový manažér




Projektový manažér – PMI

Znalostné oblasti podľa PMI metodológie

- INTEGRATION Management
- SCOPE Management
- TIME Management
- COST Management
- QUALITY Management
- HR Management
- COMMUNICATION Management
- RISK Management
- CONTRACTING Management

Projektový manažér - PMI

Fázy projektu

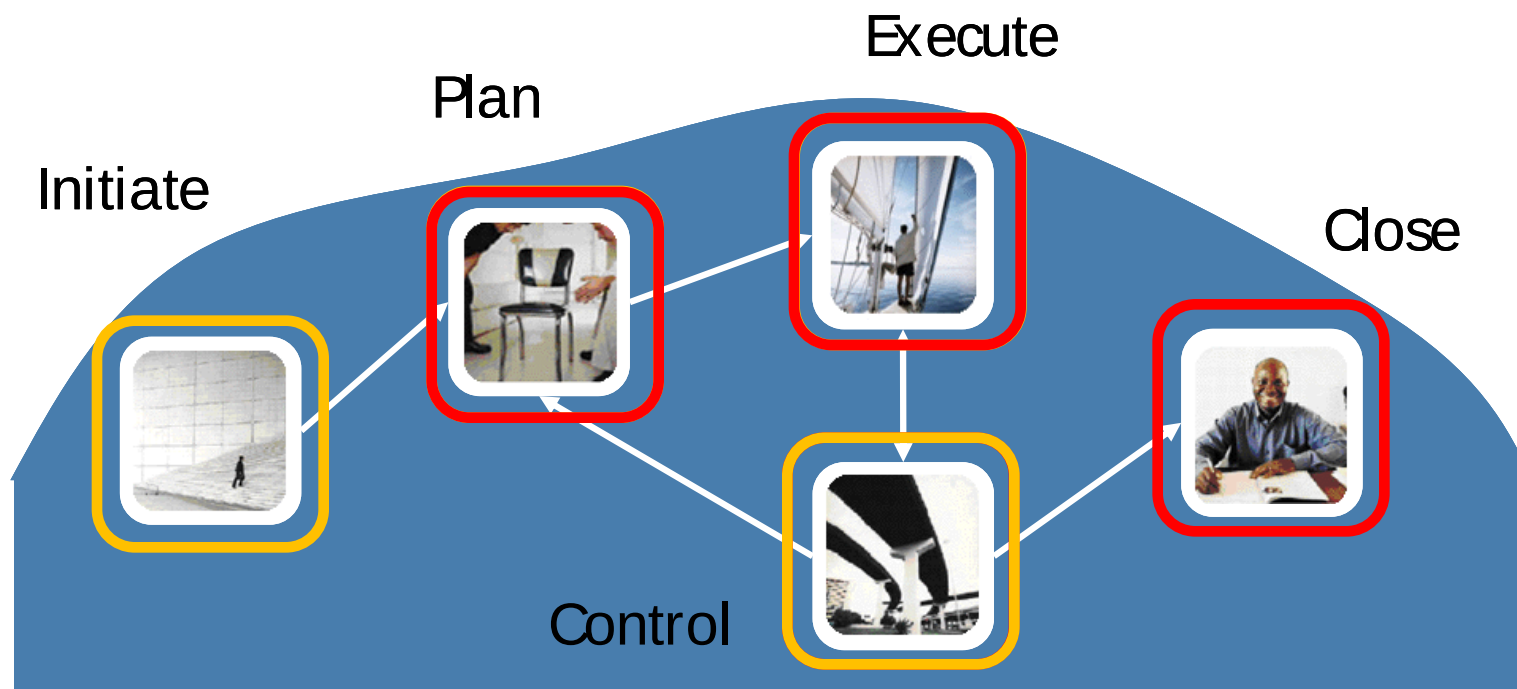

Projektový manažér – Prístup

- | | |
|----------------|--|
| • Komunikácia | <ul style="list-style-type: none">• 90% činnosti PM – vždy aktuálne informovaný• Informácie optimálne distribuovať správnym smerom• Virtuálna komunikácia vs. osobný kontakt |
| • Kvalita | <ul style="list-style-type: none">• Splnenie všetkých špecifikovaných parametrov• Dôraz na pridanú hodnotu |
| • Motivácia | <ul style="list-style-type: none">• Leadership• Prijímať feedback• Integrovať tím do celku – vdýchnuť projektového ducha |
| • Eskalácia | <ul style="list-style-type: none">• Správne posúdiť situáciu a čas kedy eskalovať• Jasne definovať problém a navrhnúť riešenie |
| • Dokumentácia | <ul style="list-style-type: none">• Nevyhnutná pre kontrolu procesov• Dokumentácia versus byrokracia |
| • Intuícia | <ul style="list-style-type: none">• Dôležitá črta PM, nie je exaktne definovaná, cit pre projektové riadenie a rozhodovanie |

Zodpovednosť a Profesionalita

Projektový manažér – Osobnost



Pasívny PM

“Dejte mi lidi, já to udělám”

Osobná skúsenosť

Riadenie projektov, riadenie tímu

Industry skúsenosť 1988-1991

- Finálna montáž videorekordérov a projekt baliacej linky

Banking skúsenosť 1992-1997

- Prepojenie pobočiek, 1. banková online sieť na Slovensku
- Prepojenie pobočiek s ústredím cez satelitnú komunikáciu

Telco skúsenosť 1998-2005


- Konsolidácia IT
- Sťahovanie výpočtového strediska
- Service Desk
- Disaster recovery – záložné výpočtové stredisko

IT skúsenosť 2005-2012

- Projekty aplikačného rozvoja pre štátnu správu
- Schengen

Aplikácia projektového riadenia v oblasti Audiovizuálnej tvorby 2009-2012

Osobná skúsenosť – Film

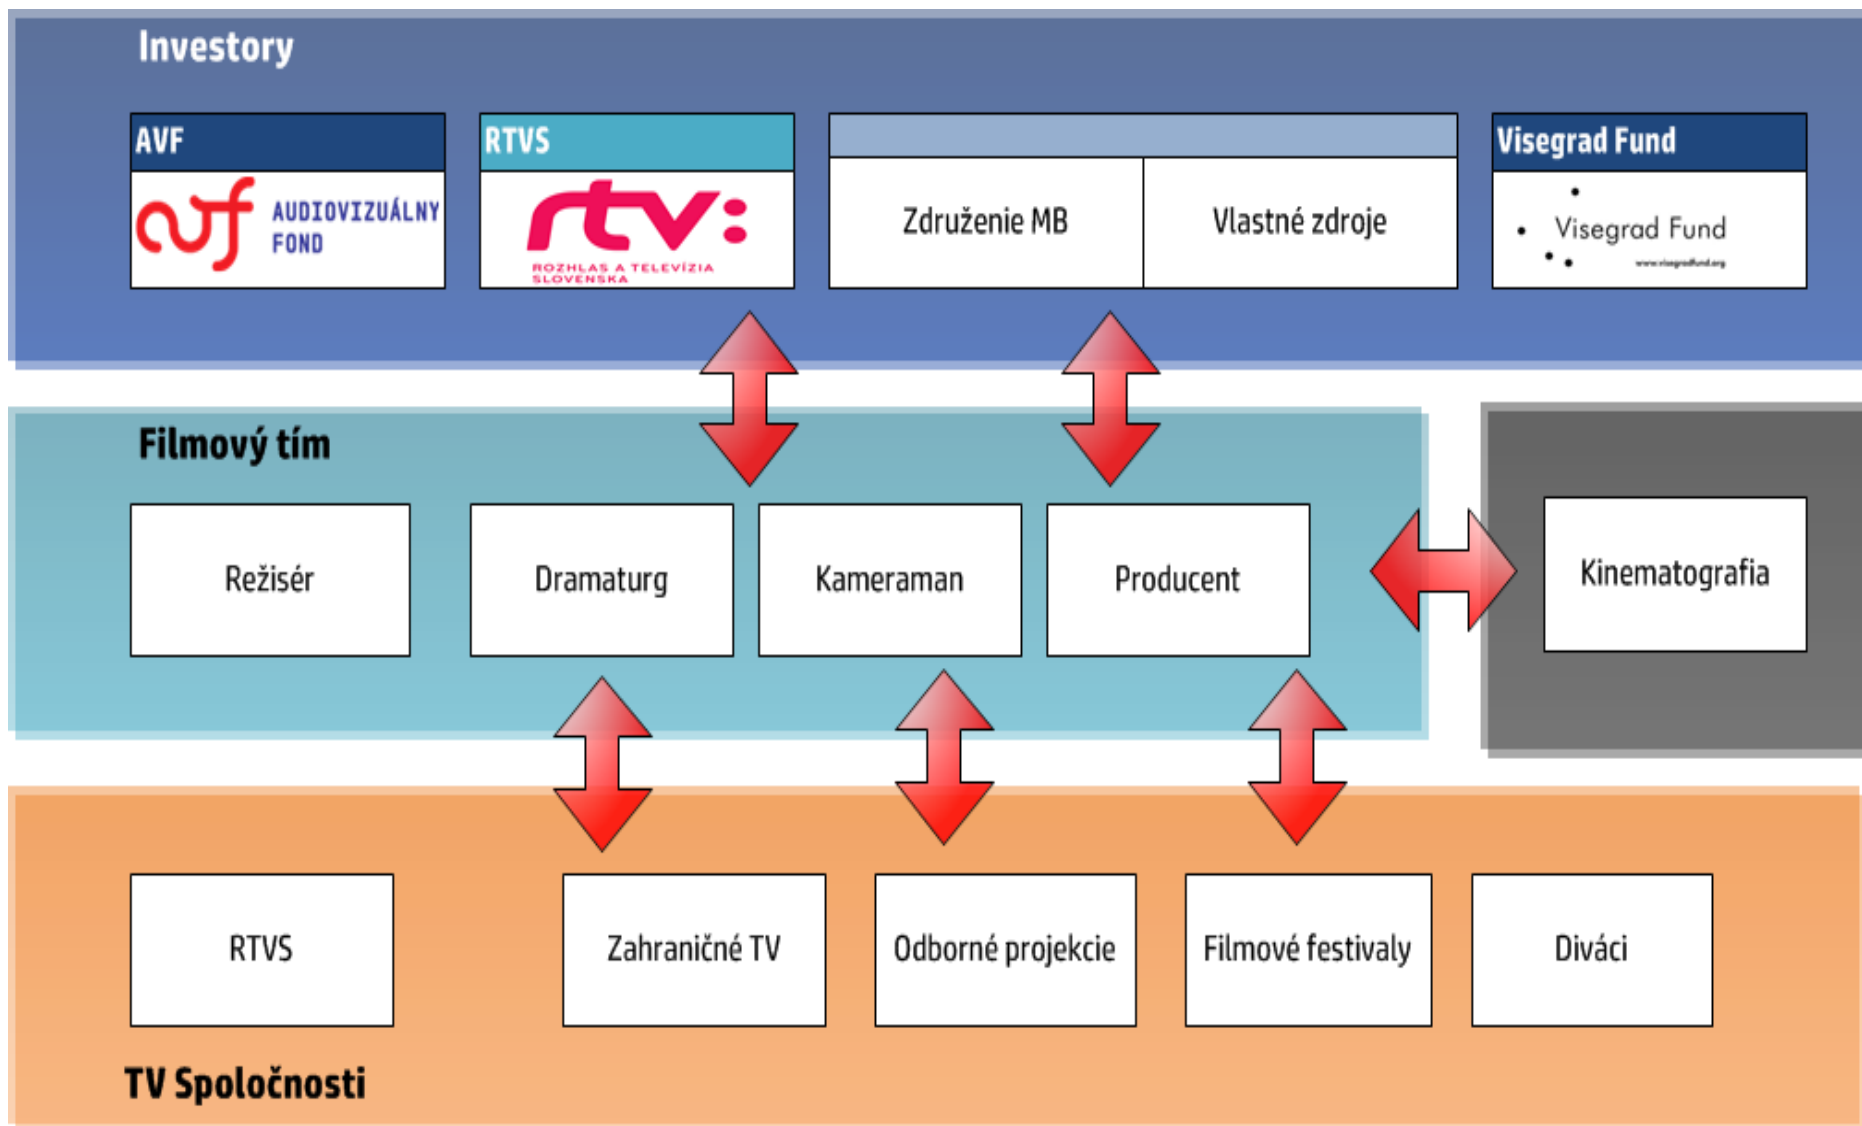

Filmová premiéra dokumentu “Móric Beňovský žije!”
bola 17.10.2012 o 19.55 na STV2




cia

cia

Móric Beňovský ako PM

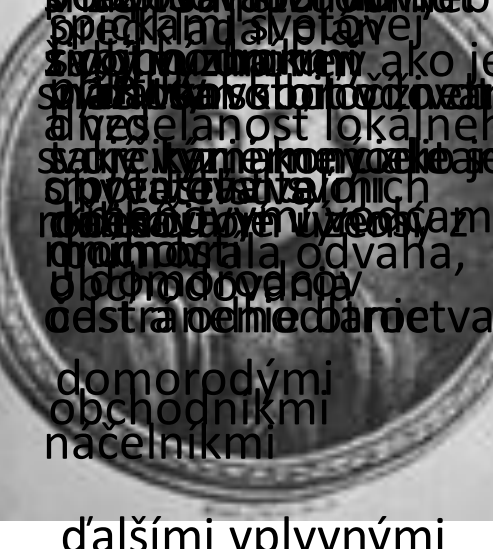

- 
- komunikoval so svetom a viedol do ním veľobľúbený
 - speckaný svetovej šľachtou a kmeťmi ako je
 - soľ, ktorá sa hľadala v celom svete
 - a veselanosť lokálneho šarmu kým nemeravne je
 - spoveď a veľkosť, a nich
 - rodu, ktorý vyznačujú
 - domom, ktorá odvaľa, obom domom
 - cesta do veľkého sveta
 - domorodými
 - obchodníkmi
 - náčelníkmi
 - ďalšími vplyvnými osobnosťami

M.Beňovský ako PM - Prístup

- | | |
|----------------|---|
| • Komunikácia | <ul style="list-style-type: none">• Špičky svetovej politiky, kmeňoví vodcovia, obchodníci• Listy, osobný kontakt, ovládanie viacerých jazykov |
| • Kvalita | <ul style="list-style-type: none">• Budovanie ciest, kreslenie máp• Zbavovanie zlých zvykov domorodcov, gramotnosť, vzdelanie |
| • Motivácia | <ul style="list-style-type: none">• Zbor dobrovoľníkov• Najbližší druhovia• Domorodci |
| • Eskalácia | <ul style="list-style-type: none">• Písanie listov predstaviteľom mocností• Účasť na bojových operáciach |
| • Dokumentácia | <ul style="list-style-type: none">• Protokol, rukopisy v národných archívoch• Pamäti a cesty |
| • Intuícia | <ul style="list-style-type: none">• Riadil sa intuíciou celý život |

Zodpovednosť a Profesionalita


M.Beňovský ako PM – Projekty

- **v roku 1772** - Projekt vybudovania obchodno-vojenskej fraktórie na Madagaskare – realizovaný v rokoch 1774-1776 (predložený francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XV).
- **v roku 1779** - Projekt vybudovania lodnej cesty Komárno-Rieka (predložený Márii Terézii)
- **v roku 1779** - Založenie spoločnosti na výrobu lodných plachiet v Uhorsku
- **v roku 1782** - Projekt podpory boja za nezávislosť USA (predložený G.Washingtonovi a Board of War)

Schengen II



Schengen II – Pokračovanie

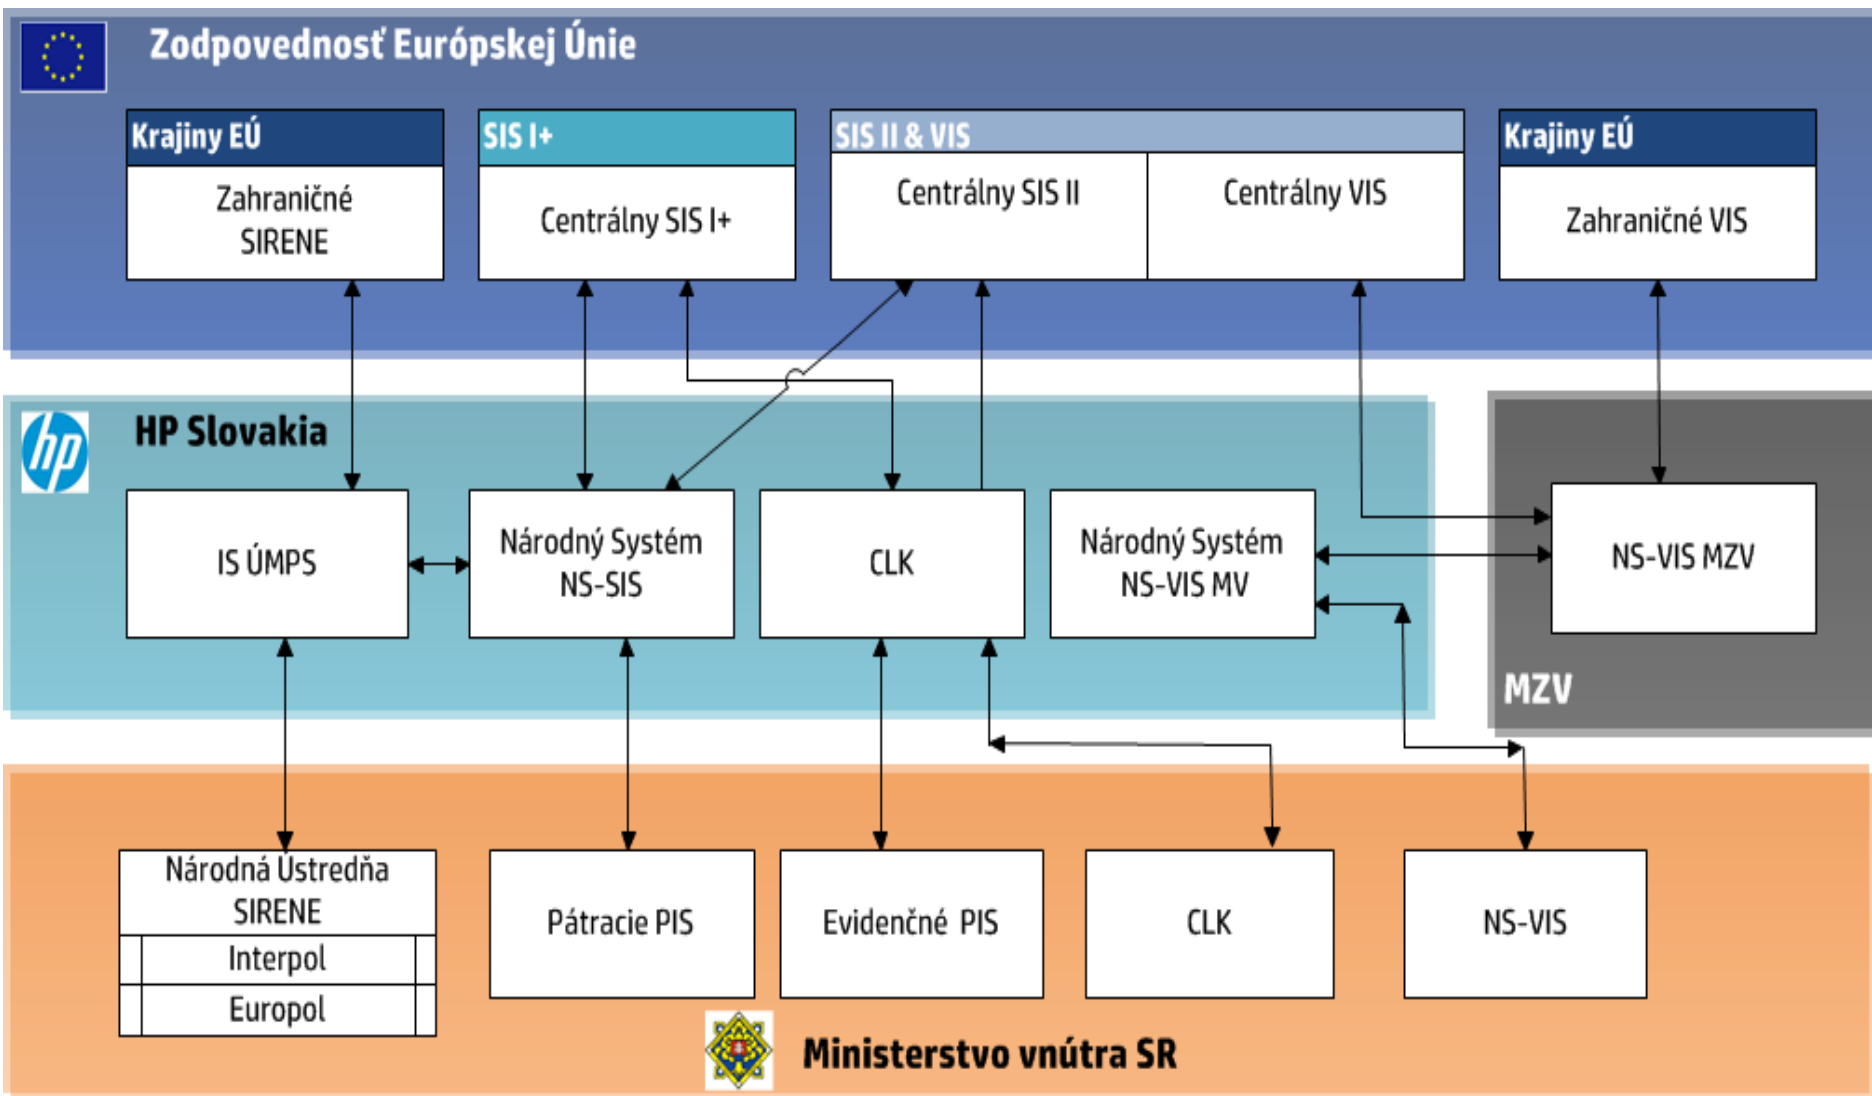

Schengen II – Pokračovanie

- EÚ ambícia : realizovať – dokončiť projekt NGSISII, vydalo nový globálny harmonogram pre krajiny – MS.
- Vývoj funkcionality NGSISII a účasť na medzinárodných testovaniach koordinovaných EK. Testy konektivity, funkcionality, konzistencie, migračné testy. Národná funkcionality a integrácia.
- V marci 2013 je plánovaná na úrovni EK migrácia krajín zo SISI+ na SIS2 t.j. realizácia projektu a sprevádzkovanie NGSISII.

Ďakujem za pozornosť

